

Mem. nº 073/2019 – GAB/RC/UFG

Catalão, 30 de abril de 2019

Aos estudantes do curso de Educação Física que ocupam o centro administrativo,

Em atenção às demandas levantadas no documento entregue via e-mail, no dia 29 de abril do corrente ano, às 11h:50min, a Direção da UFG Regional Catalão apresenta sua proposta final, nos termos que seguem:

- a) O cronograma está sendo apresentado, em anexo, para atendimento à demanda. Ressalta-se que as datas somente serão garantidas se houver desocupação imediata.
- b) A Direção da Regional somente responde àquilo que lhe é prerrogativa. A gestão de espaço físico nas Unidades Acadêmicas Especiais não é prerrogativa da Direção, portanto, não podemos arbitrariamente decidir a respeito do espaço físico do IBIOTEC.
- c) A limpeza e a manutenção da piscina será feita conforme horário definido pelo curso, respeitando o contrato com a empresa e os direitos trabalhistas dos funcionários.
- d) O prazo máximo para destinação de FCC somente pode ser garantido pelo Reitor. O Reitor somente virá à Regional após desocupação do centro Administrativo.
- e) Estamos compromissados em fazer uma consulta de interesse aos demais cursos da Regional Catalão para permuta de um TAE por um servidor terceirizado. Esta consulta ocorrerá nos próximos 30 dias, condicionada à desocupação imediata do prédio.
- f) A prioridade na distribuição de novas vagas de docentes está condicionado a partir dos estudos das novas DCNs e da criação da modalidade de Bacharelado em Educação Física na Regional Catalão.

Isto posto, a Direção reafirma, de forma incontestada, que utilizou de todas as formas para que a composição se efetivasse entre as partes, diante às respostas acima, ressaltando, apenas, que os prazos previstos e as medidas adotadas só começam a vigorar com a desocupação imediata do prédio.

Assim, a Direção reitera e requer a **DESOCUPAÇÃO IMEDIATA**.

Atenciosamente,

  
Prof. Roselma Lucchese  
Diretora da UFG Regional Catalão


Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120 – Setor Universitário – Catalão/GO.  
CEP: 75704-020 – Fone/Fax: (64) 3441-5300 - URL: <http://catalao.ufg.br>  
Assessoria de Gabinete da Regional Catalão – Fone: 3441-5303



**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA BLOCO D - CONDICIONADO A DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO BLOCO ADMINISTRATIVO, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA DE MATERIAIS PELO DMP/CAF. CASO CONTRÁRIO, O CRONOGRAMA DEVERÁ SER ATUALIZADO**

**DINFRA - Departamento de Infraestrutura**

Nome da tarefa	Duração	Início	Término
<b>1 Reparos (Mão de obra própria + Serviço contratado)</b>	<b>116,13 dias</b>	<b>Seg 18/03/19</b>	<b>Sáb 29/06/19</b>
1.1. Complemento da alvenaria	13 dias	Seg 18/03/19	Sex 29/03/19
1.2. Recolocação da cumeeira	7 dias	Sex 29/03/19	Qui 04/04/19
1.3. Vedação de furos do telhado	17 dias	Seg 25/03/19	Ter 09/04/19
1.4. Fixação de rufo	1 dia	Sex 05/04/19	Sex 05/04/19
1.5. Revisão da solda da estrutura metálica do telhado	7 dias	Ter 23/04/19	Seg 29/04/19
1.6. Troca e pintura de portas + Fechaduras + dobradiças danificadas (Material a ser adquirido pela DC)	21 dias	Seg 03/06/19	Sex 21/06/19
1.7. Recolocação de janelas	1 dia	Seg 29/04/19	Ter 30/04/19
1.8. Troca dos vidros das janelas (serviço a ser contratado pela DC)	7 dias	Sex, 07/06/2019	Qui, 13/06/2019
1.9. Impermeabilização das lajes	4 dias	Seg 03/06/19	Qui 06/06/19
1.10. Correção das calçadas	21 dias	Seg 10/06/19	Sáb 29/06/19
1.11. Tratamento das patologias	16 dias	Seg 03/06/19	Seg 17/06/19
<b>2 Instalações (Mão de obra própria + Serviço contratado)</b>	<b>159,88 dias</b>	<b>Qua 20/03/19</b>	<b>Sex 09/08/19</b>
2.1. Dimensionamento, Levantamento e solução para o abastecimento hidráulico do prédio	1 dia	Qua 20/03/19	Qui 21/03/19
2.2. Instalação da tubulação hidráulica (Material a ser adquirido pela DC)	5 dias	Seg 27/05/19	Sex 31/05/19
2.3. Dimensionamento e levantamento de tubulação/fiação lógica	1 dia	Qua 20/03/19	Qui 21/03/19
2.4. Instalação de tubulação/fiação lógica (material a ser adquirido pela DC)	10 dias	Seg 27/05/19	Qua 05/06/19
2.5. Instalação de fiação elétrica + passagem de eletrocalhas e eletrodutos (serviço contratado - Norte Engenharia)	20 dias	Seg 01/04/19	Qui 18/04/19
2.6. Instalação de luminárias (serviço contratado - Norte Engenharia)	4 dias	Seg 05/08/19	Sex 09/08/19
<b>3 Forro de gesso (Serviço contratado)</b>	<b>100 dias</b>	<b>Qui 04/04/19</b>	<b>Ter 02/07/19</b>
3.1. Instalação de estrutura de forro de gesso (serviço contratado - Norte Engenharia)	4 dias	Qui 04/04/19	Dom 07/04/19
3.2. Instalação de placas de gesso (serviço a ser contratado pela DC)	28 dias	Sex 07/06/19	Ter 02/07/19
<b>4 Pintura interna (Mão de obra própria)</b>	<b>114,88 dias</b>	<b>Qui 25/04/19</b>	<b>Seg 05/08/19</b>
4.1. Preparação da base (descascar, rebocar) - material ser adquirido pela DC	14 dias	Qui 25/04/19	Ter 07/05/19
4.2. Emassamento (material a ser adquirido pela DC)	16 dias	Ter 02/07/19	Ter 16/07/19
4.3. Lixamento (material a ser adquirido pela DC)	7 dias	Ter 02/07/19	Seg 08/07/19
4.4. Aplicação de tinta (material a ser adquirido pela DC)	23 dias	Ter 16/07/19	Seg 05/08/19
<b>5. Pintura externa (Mão de obra própria)</b>	<b>51,25 dias</b>	<b>Sex 26/04/19</b>	<b>Seg 10/06/19</b>
5.1. Preparação da base (descascar, rebocar) - material a ser adquirido pela DC	10 dias	Sex 26/04/19	Dom 05/05/19
5.2. Texturização das partes descascadas e rebocadas (material a ser adquirido pela DC)	3 dias	Seg 06/05/19	Qua 08/05/19
5.3. Aplicação de tinta (material a ser adquirido pela DC)	16 dias	Seg 27/05/19	Seg 10/06/19
<b>6 Limpeza (Mão de obra própria)</b>	<b>23 dias</b>	<b>Seg 05/08/19</b>	<b>Seg 26/08/19</b>
6.1. Limpeza final de obra (grossa)	8 dias	Seg 05/08/19	Seg 12/08/19
6.2. Limpeza final de obra (fina)	15 dias	Seg 12/08/19	Seg 26/08/19
6.3. Tratamento do piso	5 dias	Qua 21/08/19	Seg 26/08/19

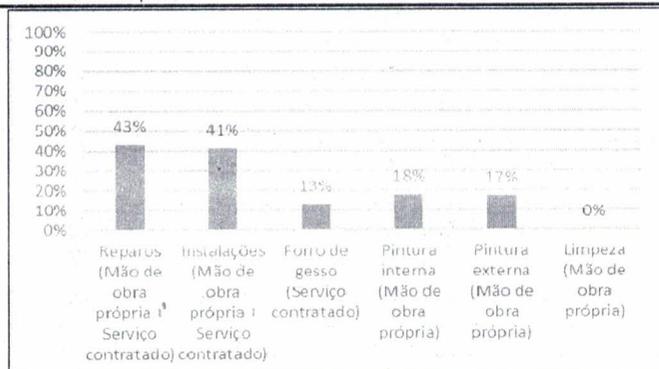

<b>% JÁ CONCLUÍDO</b>	28%
<b>% ESPERADO NO INÍCIO DAS ATIVIDADES</b>	24,66%
